



Nr.	Vorgangname	Dauer	Ressourcennamen	t '12		Nov '12				Dez '12				Jan '13				Feb '13				Mrz '13				
				KW 42	KW 43	KW 44	KW 45	KW 46	KW 47	KW 48	KW 49	KW 50	KW 51	KW 52	KW 1	KW 2	KW 3	KW 4	KW 5	KW 6	KW 7	KW 8	KW 9	KW 10	KW 11	KW 12
106	Fahrgerüste demontieren	1 Tag	Röhricht																							
107	Bodenhülsen setzen	3 Tage	Karl																							
108	Fußboden egalisieren und Dämmung	7 Tage	Karl																							
109	Fußbodenheizung / Trocken-Estrich	10 Tage	Karl																							
110	Sportfußboden	15 Tage	Becker																							
111	Prallschutz einschl. Türen	8 Tage	Diaplan																							
112	Fein-Installationen Nachrichtentechnik + Elektro	3 Tage	Meckelholt																							
113	Linierungen	3 Tage	Becker																							
114	Boden abdecken	1 Tag	Becker																							
115	Grundreinigungen	3 Tage	Endrikat																							
116	Lieferung / Installation Sportgeräte	2 Tage	Fortuna																							
117	Flur / Windfang	47 Tage																								
118	Türdurchbruch für E-Unterverteiler herstellen	8 Tage	Metz																							
119	Trockenbauarbeiten Elektro-Raum	7 Tage	Trockenbau München																							
120	Installation von NT und E-Technik u.P	5 Tage	Meckelholt																							
121	Wand- und Deckenschlitze zuspachteln	2 Tage	Jäger																							
122	Foamglasdämmung Aussenwand mit Putz	8 Tage	P.S.A																							
123	Boden- / Sockelfliesen bearbeiten	5 Tage	Weber																							
124	Anstreicher- u. Malerarbeiten	5 Tage	Jaensch																							
125	Beleuchtung / Einbauteile montieren	5 Tage	Meckelholt																							
126	Grundreinigungen	2 Tage	Endrikat																							
127	Umkleide / Wasch- und Duschräume / Behind. WC	36 Tage																								
128	Beiputz zusätzlicher Träger	5 Tage	Jäger																							
129	Abkofferungen TGA-Installationen für Schmutzwasser	5 Tage	Jäger																							
130	E-/NT-Installationen erstellen	4 Tage	Meckelholt																							
131	Wandrisse / Deckenrisse GK bearbeiten	5 Tage	Jäger																							
132	GK-Koffer wieder instandsetzen	5 Tage	Jäger																							
133	GK-Abschottungen im Sanitätsraum	2 Tage	Jäger																							
134	Maler- und Anstreicherarbeiten	6 Tage	Jaensch																							
135	TGA- Heiz./San in Betrieb nehmen (Hygienespülung)	16 Tage	Wolfferts																							
136	TGA Elektro NT nachrüsten und in Betrieb nehmen	8 Tage	Meckelholt																							
137	TGA - RLT-Anlage in Betrieb nehmen	8 Tage	Ulrich																							
138	Grundreinigung	5 Tage	Endrikat																							
139	Osterferien	12 fTage																								
140	Aula	107 Tage																								

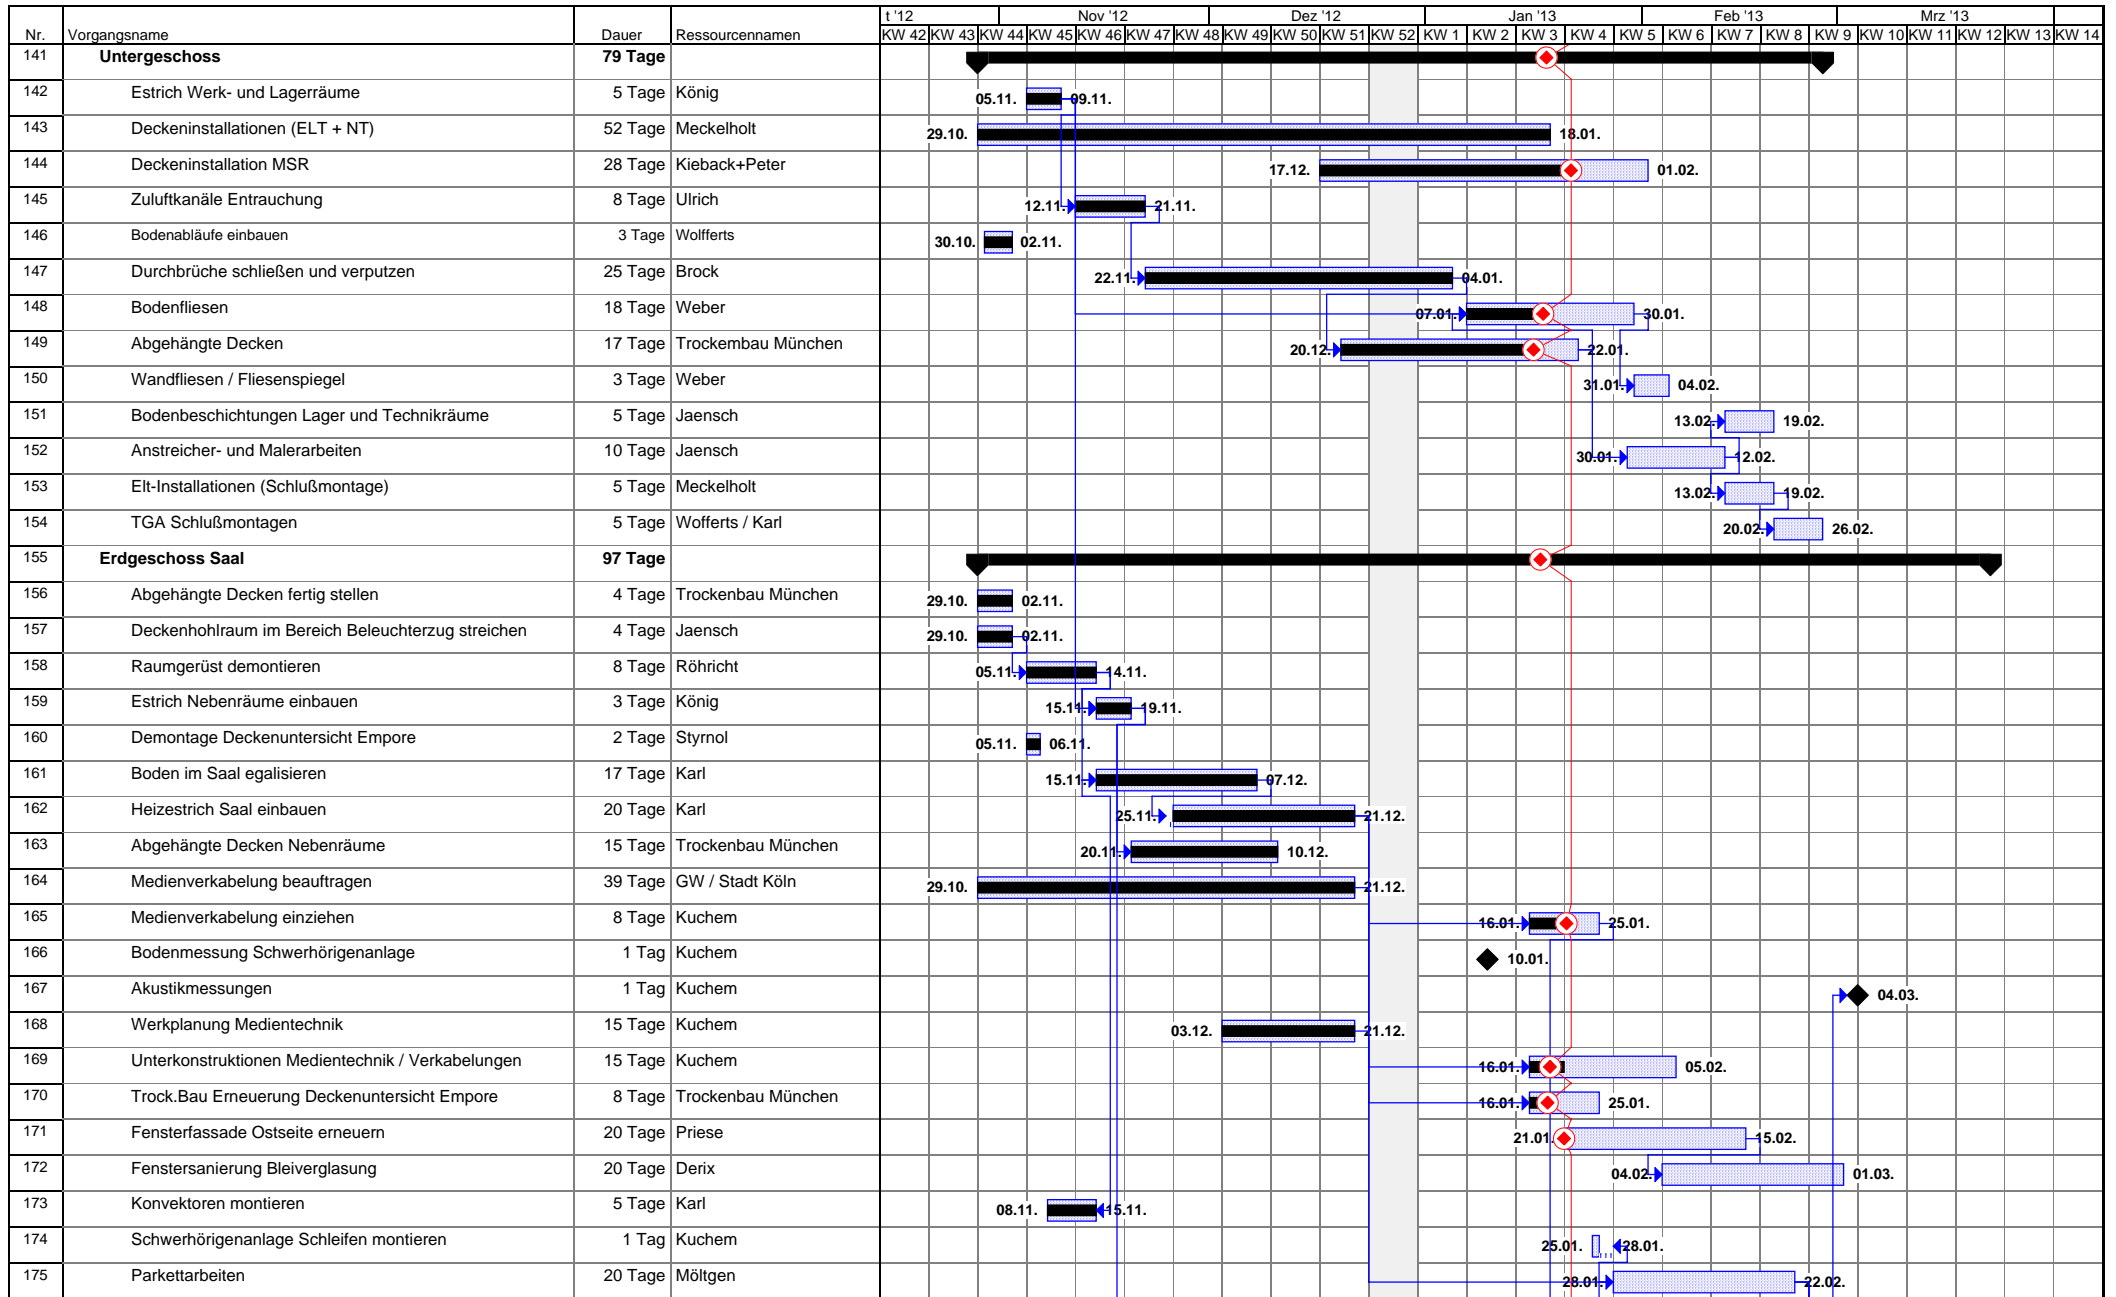

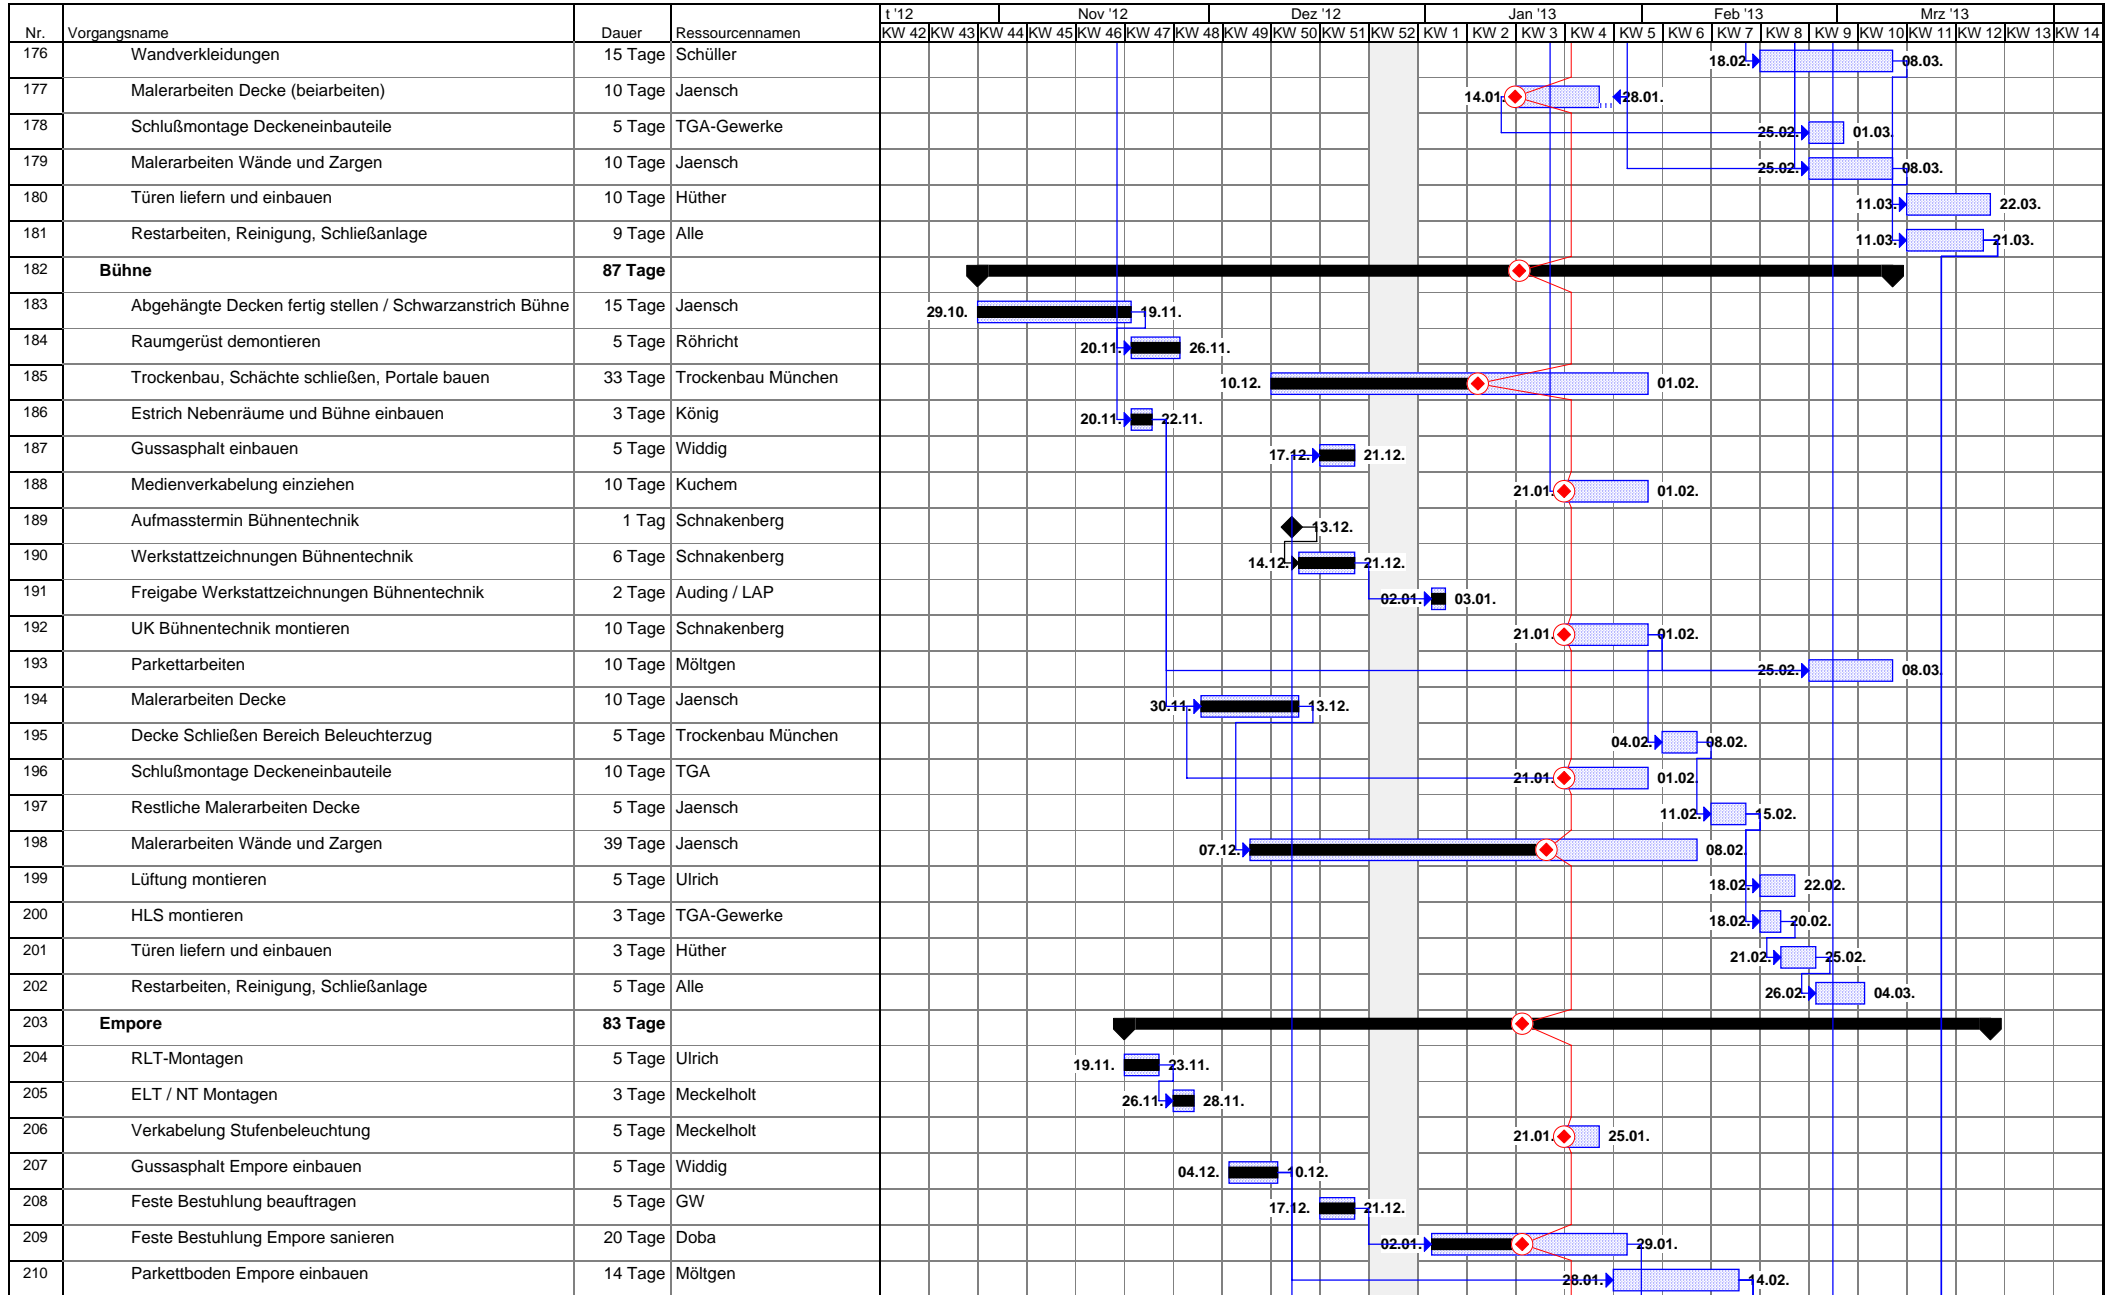

Nr.	Vorgangname	Dauer	Ressourcennamen	t '12		Nov '12				Dez '12				Jan '13				Feb '13				Mrz '13					
				KW 42	KW 43	KW 44	KW 45	KW 46	KW 47	KW 48	KW 49	KW 50	KW 51	KW 52	KW 1	KW 2	KW 3	KW 4	KW 5	KW 6	KW 7	KW 8	KW 9	KW 10	KW 11	KW 12	KW 13
211	Feste Bestuhlung einbauen	16 Tage	Doba																								
212	Wandverkleidung ausschreiben / Submission	23 Tage	Patelkos / GW																								
213	Wandverkleidungen Empore beauftragen	10 Tage	GW																								
214	Orgel remontieren	5 Tage	Weimbs																								
215	UK Wandverkleidung montieren	5 Tage	NN																								
216	Wandverkleidungen liefern und einbauen	10 Tage	NN																								
217	Regiepult erstellen und montieren	10 Tage	NN																								
218	Malerarbeiten Decke (Restanstriche)	5 Tage	Jaensch																								
219	Schlußmontage Deckeneinbauteile	10 Tage	TGA Gewerke																								
220	Malerarbeiten Wände und Zargen	5 Tage	Jaensch																								
221	Lüftung montieren	5 Tage	Ulrich																								
222	HLS montieren	8 Tage	TGA-Gewerke																								
223	Türen liefern und einbauen	3 Tage	Hüther																								
224	Restarbeiten, Reinigung, Schließanlage	8 Tage	Alle																								
225	Ausstattung / Abnahme / Inbetriebnahme	15 Tage																									
226	Vorhänge Installation	5 Tage	Schnakenberg																								
227	Beleuchtung Installation	5 Tage	Schnackenberg																								
228	Beschallung Installation	5 Tage	Kuchem																								
229	Inbetriebnahme / Probebeschallungen etc.	5 Tage	Kuchem / Schnakenberg																								
230	Abnahme	5 Tage	Alle																								
231	Osterferien	12 fTage																									
