

Faulbach (Flehbach)

Maßnahmen-Nr.: 8

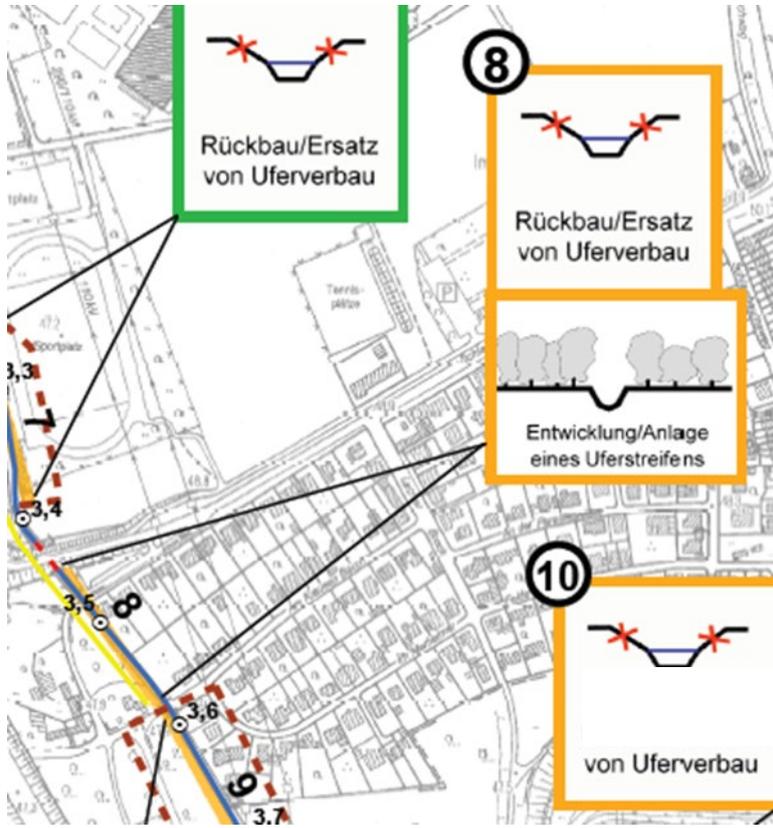
Bearbeitungsstrecke: von km 3,45 bis km 3,58

Foto Ist-Zustand (M8), gegen die Fließrichtung



Foto Ist-Zustand (M8), in Fließrichtung



Faulbach (Flehbach)	
Maßnahmen-Nr.: 8	Bearbeitungstrecke: von km 3,45 bis km 3,58
Umsetzungsfahrplan (Stand März 2012)	
	
Maßnahmenbeschreibung Umsetzungsfahrplan	
Entwicklung von Habitaten und Entfernen von Ufer- und Sohlverbau Linksseitiges Anlegen eines Gewässerrandstreifens Austausch des Sohlsubstrats durch natürliche Sande aus einem oberstromigen Sandfang Einbau von Totholz	
Restriktionen	
Versorger:	Strom, Gas, Wasser vorhanden. Telekom, fehlt noch.
Kampfmittel:	wird noch abgefragt
Boden:	Restriktion durch rechtsseitige Wohnbebauung und Altablagerung
Grundstück:	Wohnhäuser nutzen das rechte Bachufer
Sonstiges:	Höhenlage durch vorhandene Durchlässe vorgegeben.
Bewuchs:	Rodungen im Winterhalbjahr

Faulbach (Flehbach)

Maßnahmen-Nr.: 8

Bearbeitungsstrecke: von km 3,45 bis km 3,58

Gestaltungsidee



Maßnahmenbeschreibung Gestaltungsidee

Linkes Vorland:

Waldchen nutzen für Nebengerinne / Entwicklungskorridor

Linkes Ufer:

Entwicklung von Habitaten durch Entfernen des Ufer-/Sohlverbaus (teilweise Ersatz) und partieller linksseitiger Initiierung eigendynamischer Entwicklung.

Sohle:

Strukturverbesserung durch Auflandungen, Stör- und Leitsteine, verankertem Totholz. Zusätzlich Sohlbreitenvarianz schaffen.

Rechtes Ufer:

Verbau an den Ufern entfernen und durch ingenieurbioologische Bauweisen sichern. Ufernutzung der Anwohner klären (Zaun bauen).

Rechtes Vorland:

Keine Veränderung möglich (Wohnhäuser).

Genehmigungsverfahren

Gewässerunterhaltung

§ 68 WHG

§ 99 LWG
