BÜHNEN KÖLN
SANIERUNG
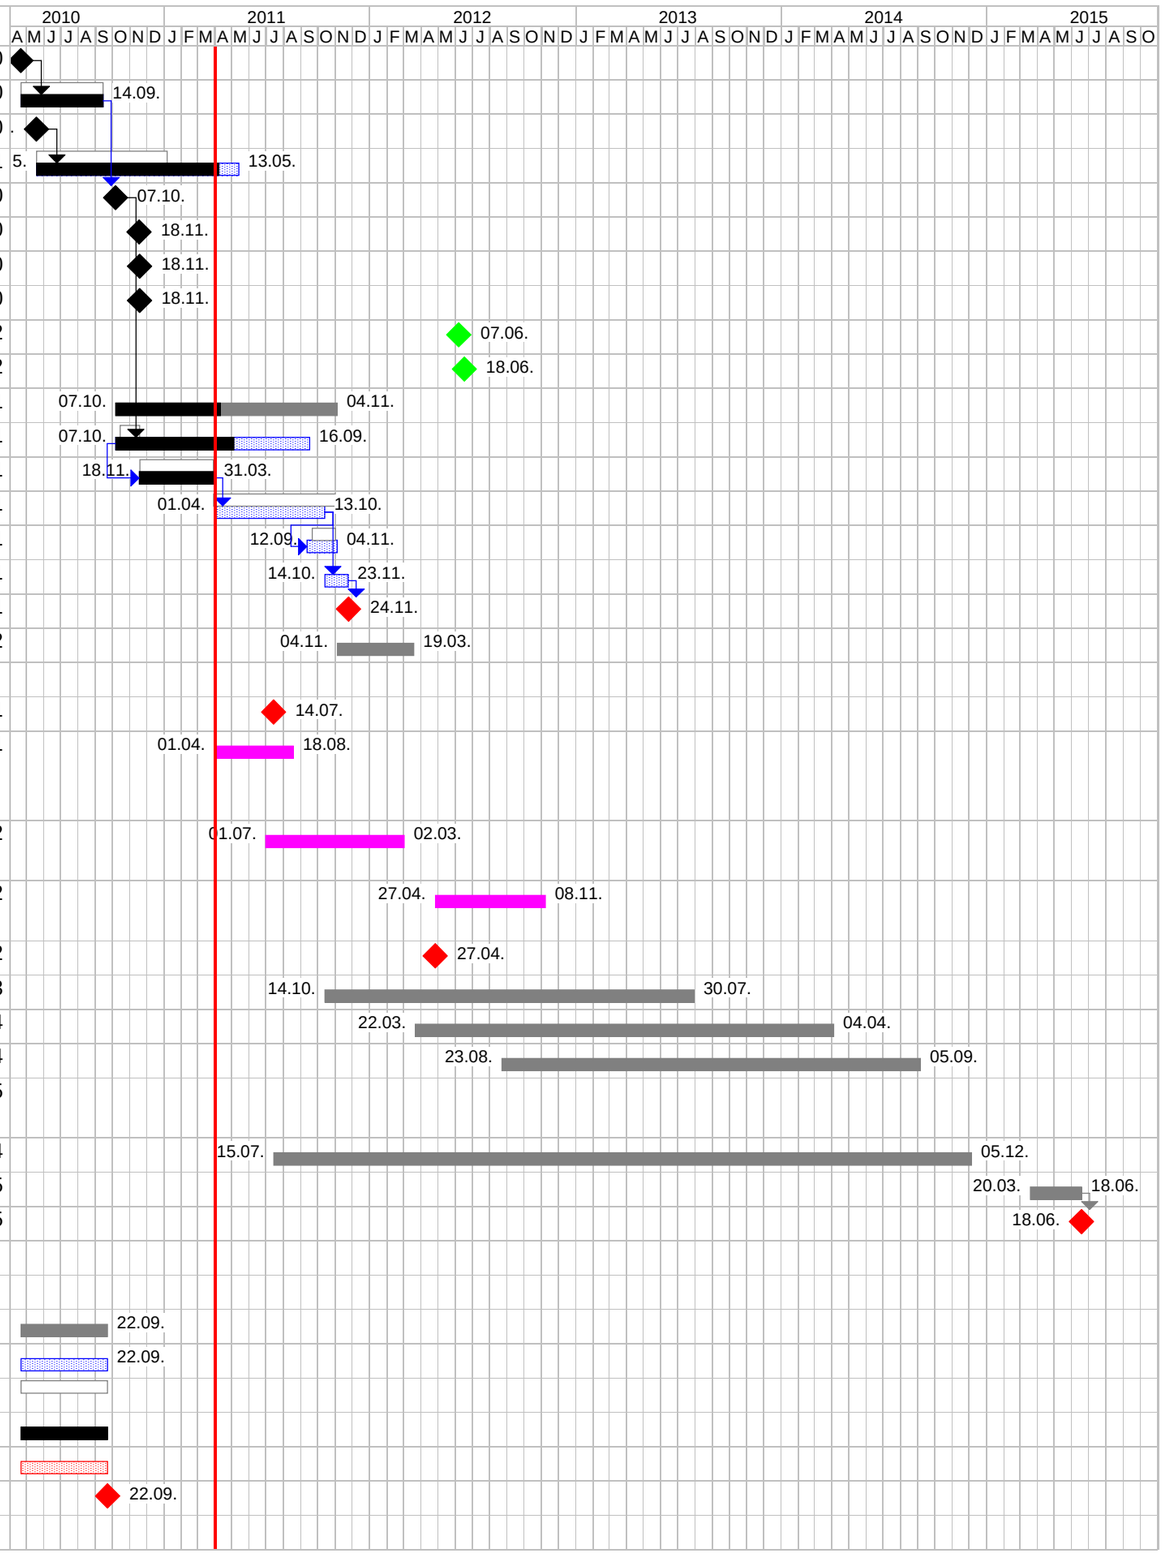
Nr.	Vorgangsname	Zuständig	%	Anfang	Ende
1	**Projektstart**		100%		Do 22.04.10
2	**Machbarkeitsstudie**		100%	Do 22.04.10	Di 14.09.10
3	**Genehmigung Planungsmittel VOF-Verfahren**	VI; VII	100%		Do 20.05.10
4	**VOF-Verfahren**	GW	90%	Do 20.05.10	Fr 13.05.11
5	**Planungsbeschluss**	Rat	100%		Do 07.10.10
6	**Raum- und Funktionsprogramm**	Bühnen	100%		Do 18.11.10
7	**Terminrahmen**	Bühnen	100%		Do 18.11.10
8	**Kostenrahmen**	Bühnen	100%		Do 18.11.10
9	**Ende Spielbetrieb**	Bühnen	0%		Do 07.06.12
10	**Übergabe Gebäude zur Ausführung**	Bühnen	0%		Mo 18.06.12
11	**Objektplanung Gebäude - Planung**			Do 07.10.10	Fr 04.11.11
12	Grundlagenermittlung	HPP-TPD	60%	Do 07.10.10	Fr 16.09.11
13	Vorplanung	HPP-TPD	100%	Do 18.11.10	Do 31.03.11
14	Entwurfsplanung	HPP-TPD	0%	Fr 01.04.11	Do 13.10.11
15	Genehmigungsplanung	HPP-TPD	0%	Mo 12.09.11	Fr 04.11.11
16	**Baubeschlussvorlage**	GW	0%	Fr 14.10.11	Mi 23.11.11
17	**Baubeschluss**	Rat	0%		Do 24.11.11
18	**Genehmigungsverfahren**			Fr 04.11.11	Mo 19.03.12
22	**Vorgezogene Maßnahmen**				
23	**Baubeschluss Vorgezogene Maßnahmen**	Rat	0%	Do 14.07.11	Do 14.07.11
24	**-Objektplanung Gebäude- Entwurfs- und Ausführungsplanung, Leistungsbeschreibung**			Fr 01.04.11	Do 18.08.11
31	**-Objektplanung Gebäude- Ausschreibung und Vergabe**			Fr 01.07.11	Fr 02.03.12
38	**-Objektplanung Gebäude- Ausführung**			Fr 27.04.12	Do 08.11.12
45	**Baubeginn**	HPP-TPD	0%		Fr 27.04.12
46	**Objektplanung Gebäude - Ausführungsplanung**	HPP-TPD		Fr 14.10.11	Di 30.07.13
52	**Objektplanung Gebäude - Leistungsbeschreibung**	HPP-TPD		Do 22.03.12	Fr 04.04.14
58	**Ausschreibung und Vergabe**	HPP-TPD		Do 23.08.12	Fr 05.09.14
64	**Objektplanung Gebäude - Ausführung**	HPP-TPD	0%	Mo 25.02.13	Do 19.03.15
96	**Außenanlagen**	WES		Fr 15.07.11	Fr 05.12.14
102	**Inbetriebnahme und Probebetrieb**	HPP-TPD; SR	0%	Fr 20.03.15	Do 18.06.15
103	**Übergabe**	GW	0%		Do 18.06.15
104					
105	**Legende**				
106	Sammelvorgang				
107	Vorgang				
108	Basisvorgang				
109	Erfüllung				
110	kritisch				
111	Meilenstein				
112
