



---

# MÜLHEIM 2020

Wege öffnen - Übergänge schaffen – zusammen wachsen

## Zeit-Maßnahmenplan MÜLHEIM 2020

Veedelsbeirat MÜLHEIM 2020 am 2. Mai 2011



## MÜLHEIM 2020

---

### Zeit-Maßnahmenplan – Auftragsvergabe

- 18.05.2010      Versand Leistungsbeschreibung
- 29.06.2010      Frist zur Angebotsabgabe
- 30.09.2010      Zuschlagsfrist
- 25.10.2010      Vertragsabschluss
- 31.03.2011      Vertragsende
  
- Auftragnehmer: Management consult GmbH, Bonn



# MÜLHEIM 2020

---

## Zeit-Maßnahmenplan – Rahmenbedingungen

- MÜLHEIM 2020 – rund 40 Projekte insgesamt
  - ➔ Handlungsfeld Lokale Ökonomie – 8 Projekte
  - ➔ Handlungsfeld Bildung – 7 (12) Projekte
  - ➔ Handlungsfeld Städtebau – 14 Projekte
  - ➔ Programmsteuerung und Stadtteil- und Programmmarketing
- MÜLHEIM 2020 – 39,8 Millionen Euro
- MÜLHEIM 2020 – 14 beteiligte Fachämter
- MÜLHEIM 2020 – Projektlaufzeit endet 30.09.2014



# MÜLHEIM 2020

---

## Zeit-Maßnahmenplan – Zielsetzung

- Detaillierte Projektpläne aufstellen
- Meilensteine identifizieren
- Abhängigkeiten erkennen
- Projektkoordination optimieren
- Einheitlicher Kenntnisstand aller Beteiligten



# MÜLHEIM 2020

---


## Zeit-Maßnahmenplan – Arbeitsschritte

- Projekte in **Teilaufgaben und Arbeitspakete** unterteilen
- **Bearbeitungsdauer** je Arbeitspaket einschätzen
- logische **Verknüpfungen** zwischen den Arbeitspaketen ermitteln
- **Meilensteine** festlegen
- **Feinabstimmungen** und **Überarbeitungen**
  
- **Kooperatives Planungsverfahren:** 28 Abstimmungstermine



# MÜLHEIM 2020

## Handlungsfeld 1: Frau und Beruf

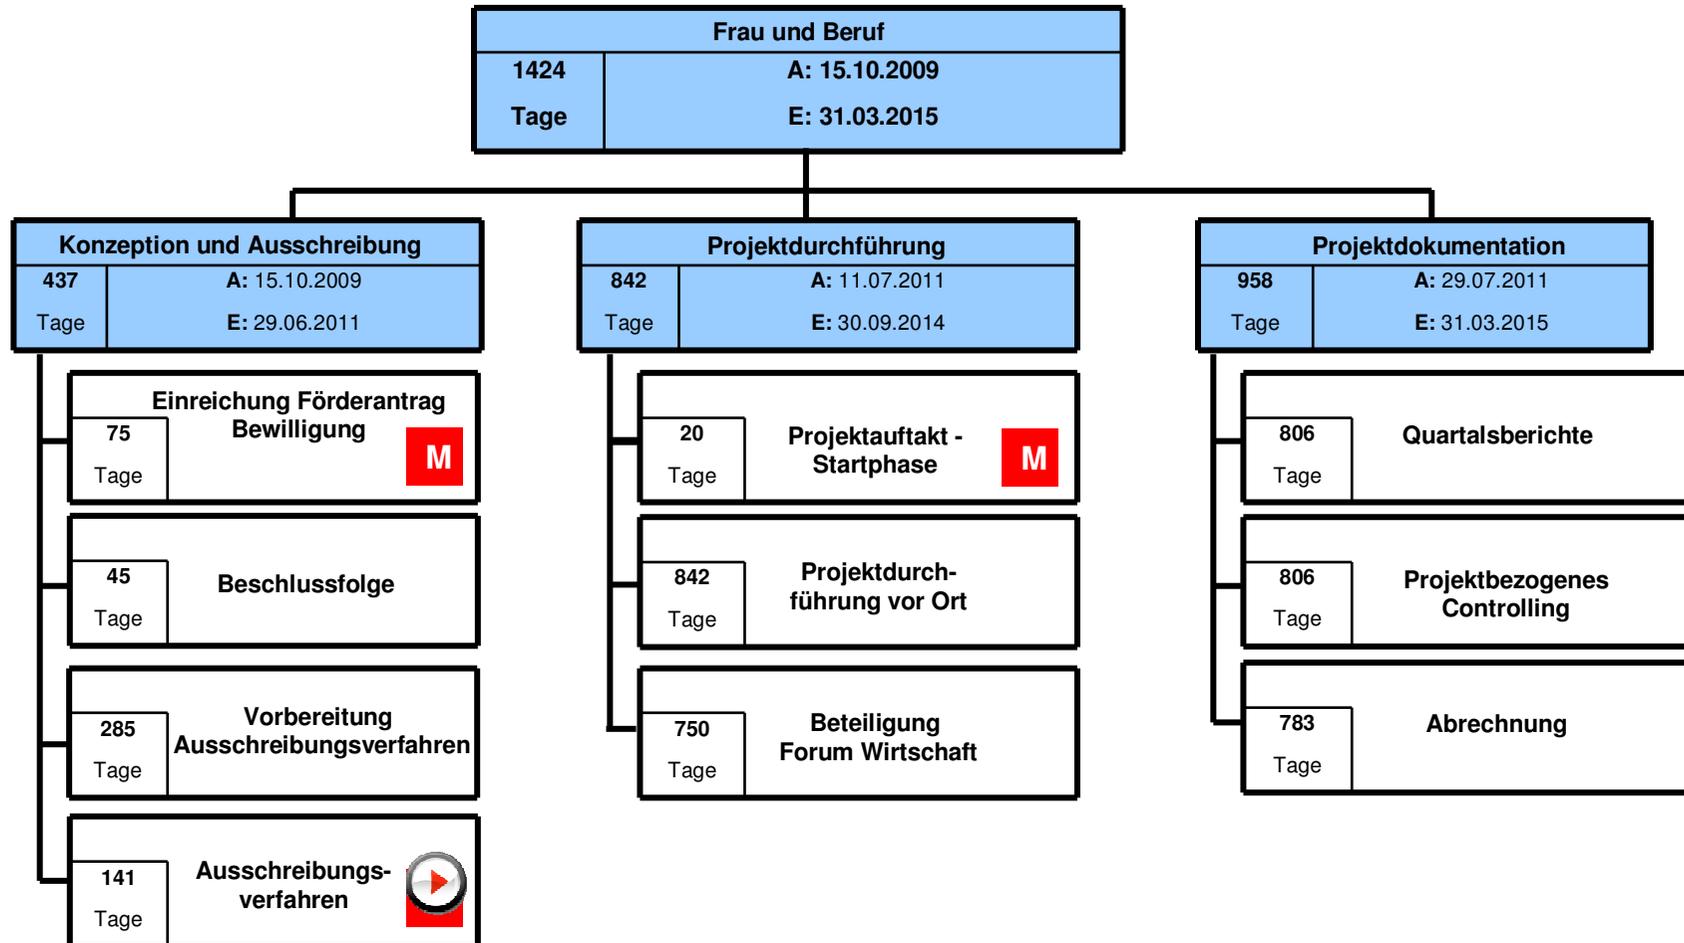




# MÜLHEIM 2020

## Handlungsfeld 1: Frau und Beruf


### Ausschreibungsverfahren

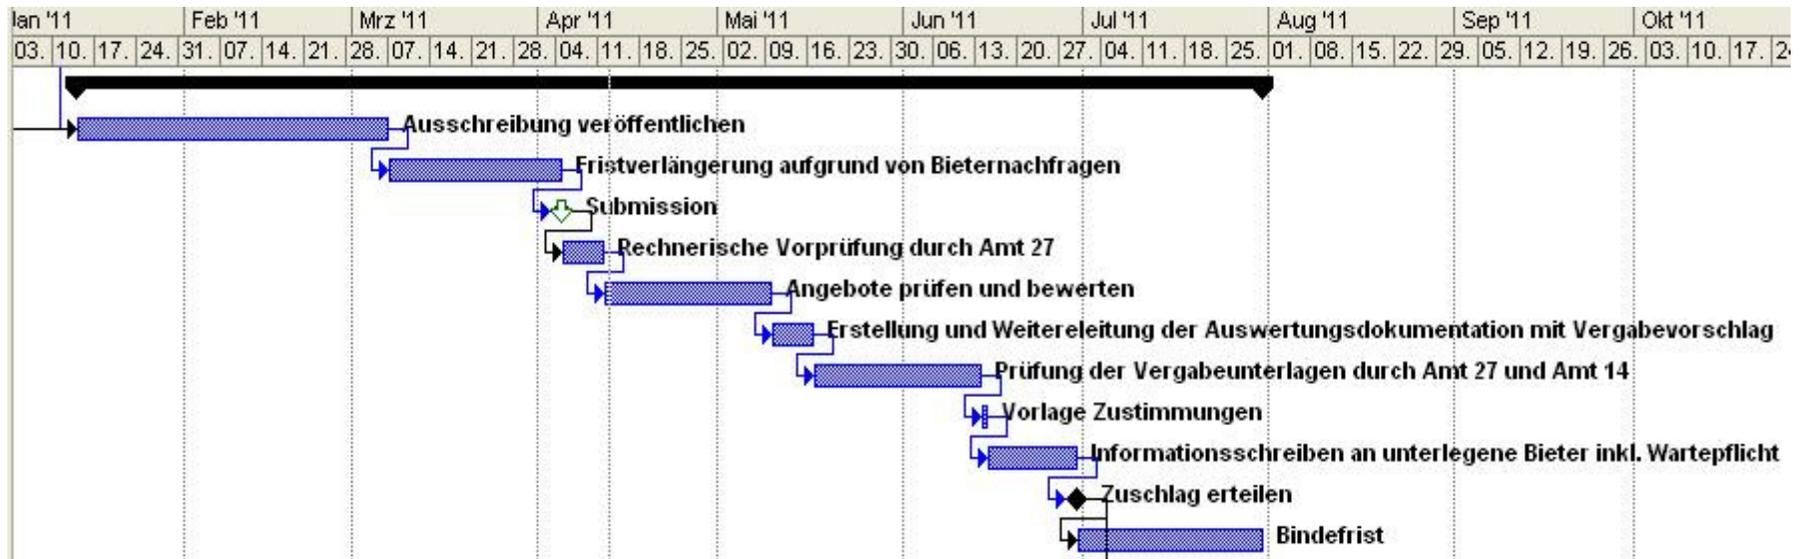



# MÜLHEIM 2020

## Handlungsfeld 2: Stadtteilmütter

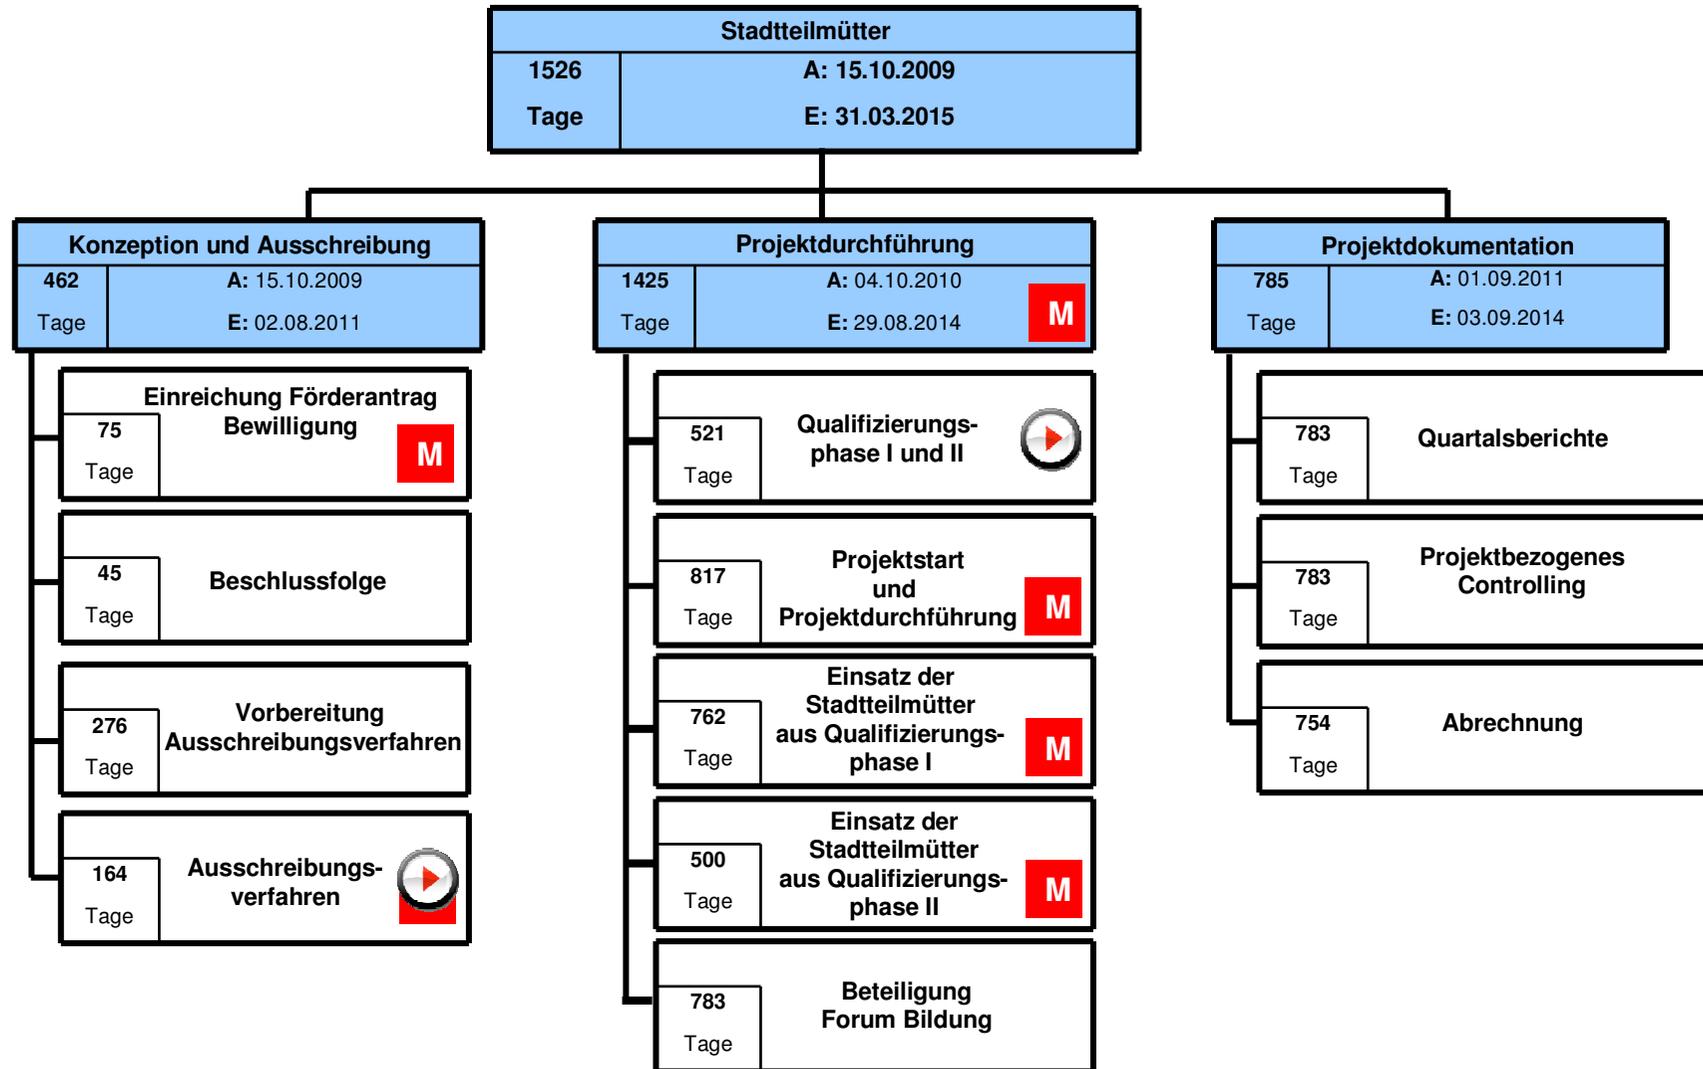




# MÜLHEIM 2020

## Handlungsfeld 2: Stadtteilmütter


### Qualifizierungsphasen

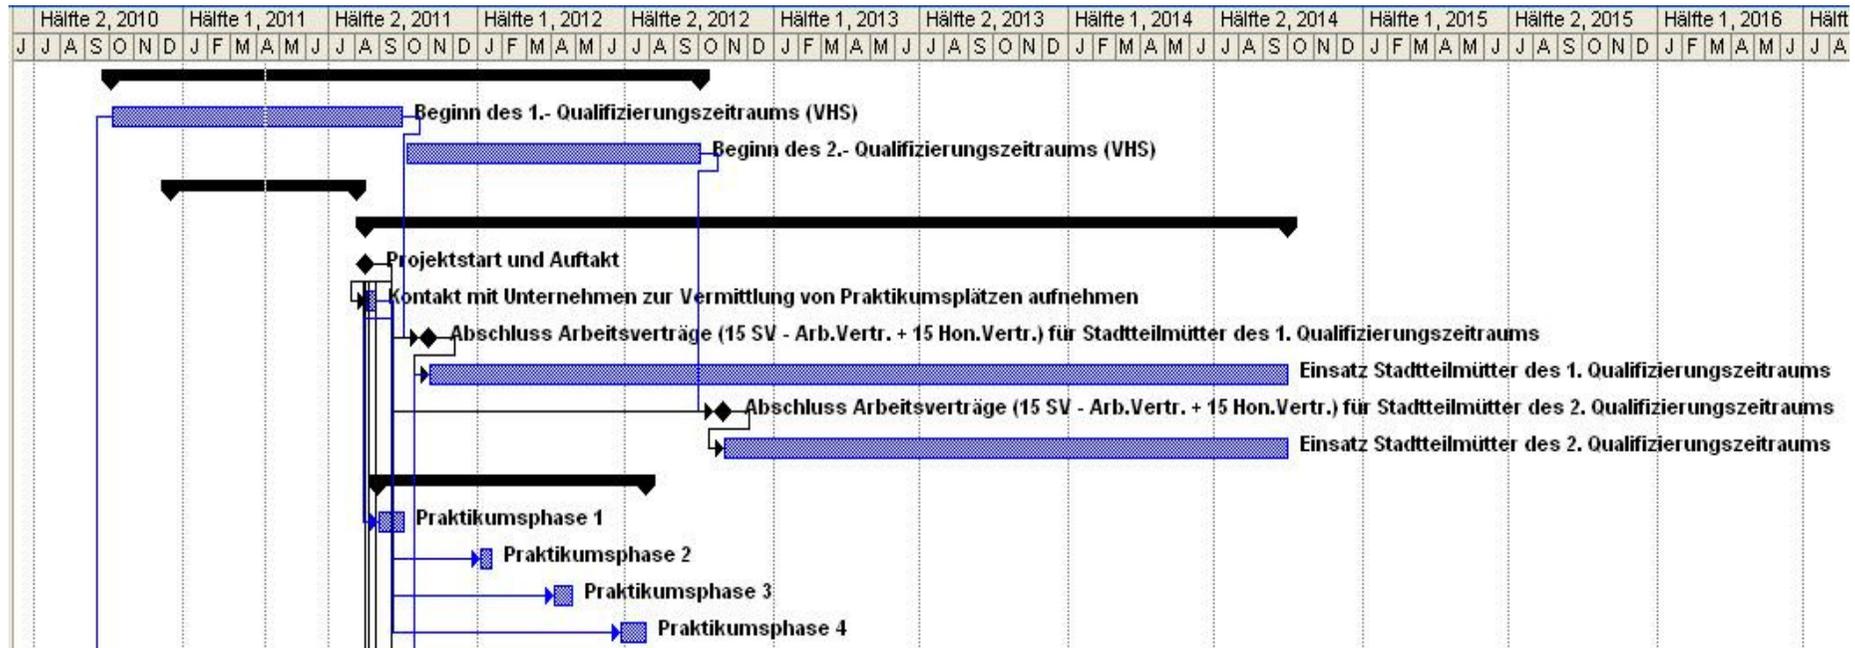



# MÜLHEIM 2020

## Handlungsfeld 3: Rheinboulevard

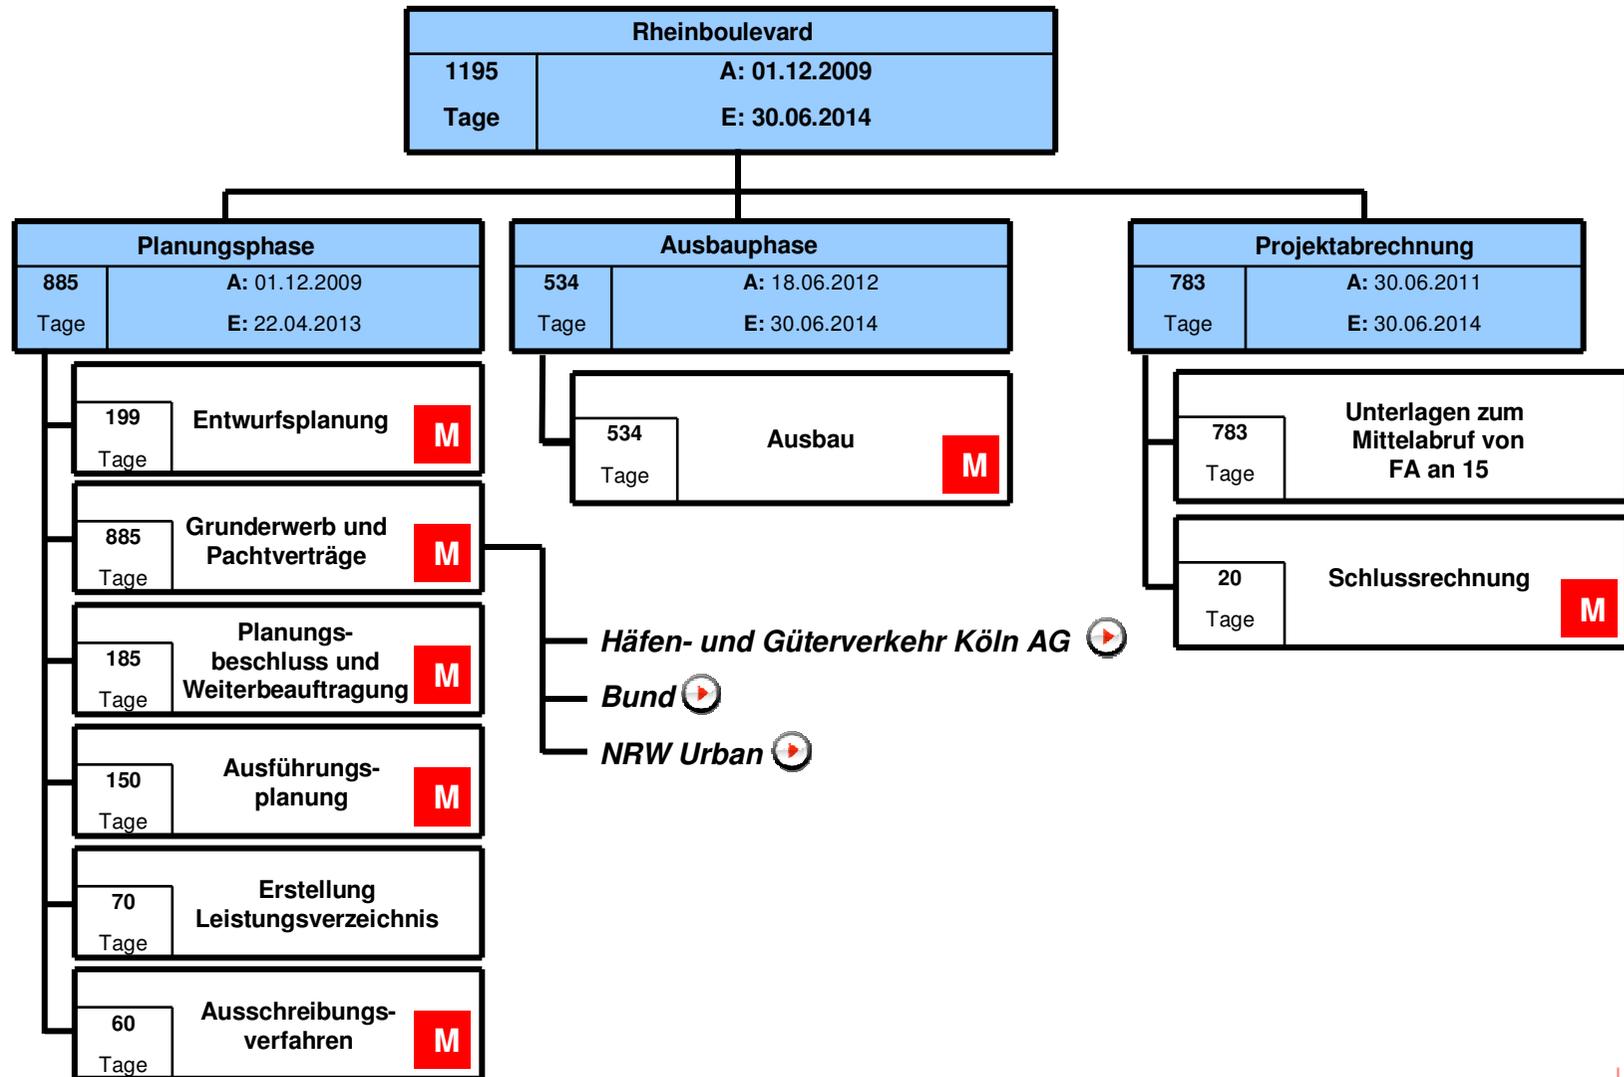






# MÜLHEIM 2020

## Handlungsfeld 3: Rheinboulevard

### Grunderwerb und Pachtverträge

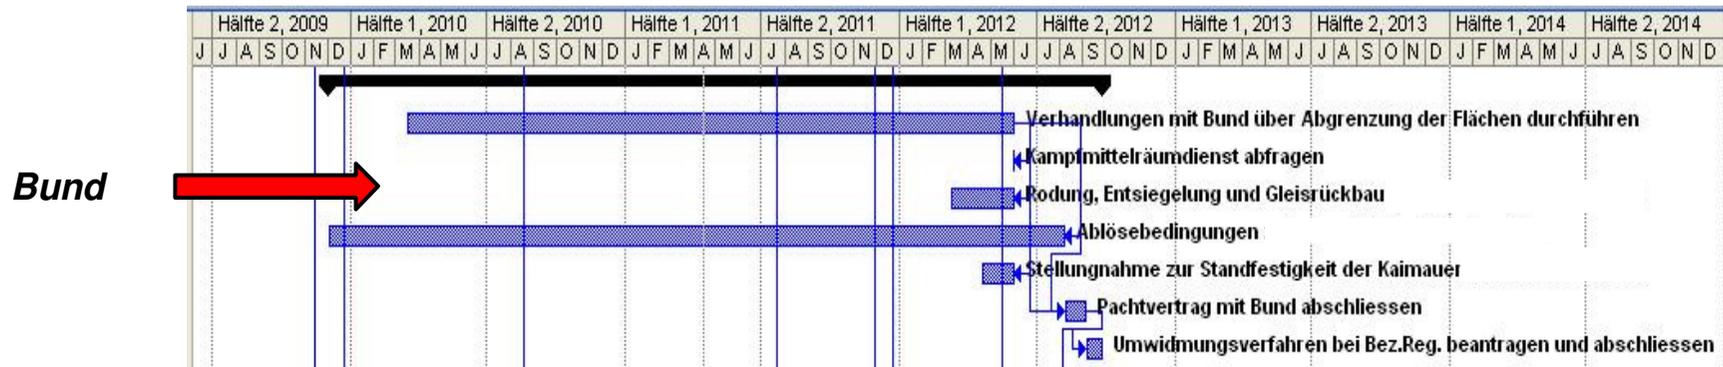

Weiter zu *NRW Urban*


Zurück zur Übersicht



# MÜLHEIM 2020

## Handlungsfeld 3: Rheinboulevard

### Grunderwerb und Pachtverträge

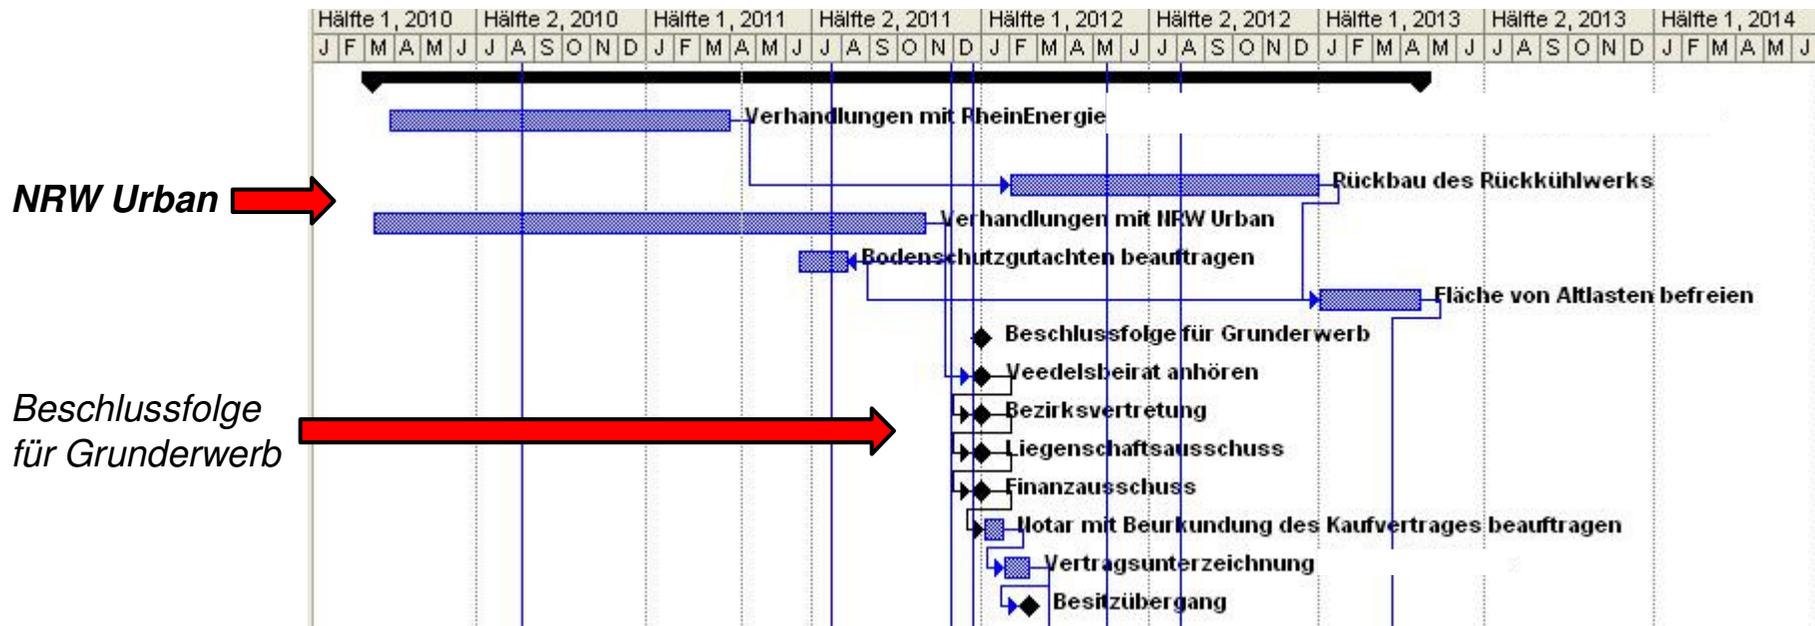

NRW Urban →

Beschlussfolge für Grunderwerb →

Weiter

Zurück zur Übersicht



# MÜLHEIM 2020

---

## Zeit-Maßnahmenplan – Fazit

- ZMP – Dynamisches Arbeitsinstrument
- ZMP – Hoher Informationsgehalt
- ZMP – Großer Aktualisierungsbedarf
- ...
- ...
